

WBS y Organigrama del Proyecto

Entregable 1, Gestión y Reportes
Proyecto FIDSW, Grupo Los FIS

David Galindo Rojas

Miguel Ángel Gómez

Juan Sebastián Gómez

David Álvarez Rodríguez

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería

1. Contexto del proyecto

El proyecto FIDSW se organizó mediante un WBS, agrupando las 20 historias de usuario en grupos funcionales que cuenten con una relación entre sí. Esta estructura permite representar de forma jerárquica el alcance del proyecto y facilita la planificación, asignación y seguimiento de las actividades.

Durante este proceso se revisó cada una de las historias mediante criterios de análisis como INVEST. Se establecieron prioridades y se definieron criterios de aceptación utilizando la estructura Given/When/Then. Esto permitió describir de forma clara el contexto de cada historia, la acción que debe realizar el usuario o el sistema y el resultado esperado de la funcionalidad.

Además, cada historia fue complementada con sub-historias que permiten descomponer el trabajo necesario para su desarrollo, incluyendo actividades de implementación, validación y pruebas. También se estableció una Definition of Done, que es un conjunto de condiciones que deben cumplirse antes de considerar una historia terminada. Algunos ejemplos de DoD pueden ser la validación funcional, la ejecución de pruebas, la integración del trabajo y la aprobación correspondiente.

Finalmente, las historias de usuario fueron gestionadas mediante el tablero Kaban de GitHub, con GitHub Issues y GitHub Projects, utilizando estados, etiquetas y criterios de seguimiento para organizar el trabajo del equipo. Esta estructura permite relacionar cada funcionalidad con su trabajo de desarrollo y visualizar el avance del proyecto mediante un tablero de seguimiento.


2. WBS del proyecto

La estructura se organiza en tres niveles: Nivel 1: Proyecto FIDSW. Nivel 2: Contenido. Nivel 3: Historias de usuario relacionadas. La clasificación de las historias sigue la agrupación definida para el proyecto.

Elemento WBS	Contenido	Historias relacionadas
Proyecto FIDSW	Gestión general del proyecto	Áreas funcionales y sus historias de usuario
1. Autenticación y acceso	Área funcional del sistema	HU-001, HU-006, HU-008, HU-018
2. Planes de acción	Área funcional del sistema	HU-002, HU-004, HU-017, HU-020
3. Seguimiento y control	Área funcional del sistema	HU-007, HU-012
4. Gestión de evidencias	Área funcional del sistema	HU-003, HU-016, HU-019
5. Informes y exportación	Área funcional del sistema	HU-011, HU-014
6. Notificaciones	Área funcional del sistema	HU-005, HU-015
7. Administración	Área funcional del sistema	HU-009, HU-010, HU-013

2.1. Estructura jerárquica

Proyecto FIDSW

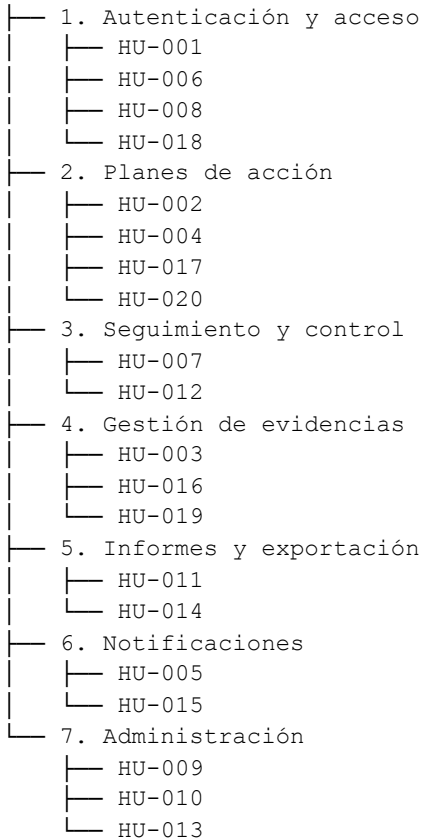

3. Detalle del WBS por historias

ID	Historia de usuario	Prioridad
HU-001	Login en el sistema	Alta
HU-002	Registro de planes de acción	Media
HU-003	Carga de evidencias documentales	Media
HU-004	Seguimiento de avance de actividades	Media
HU-005	Notificaciones de vencimiento de actividades	Alta
HU-006	Autenticación y control de roles	Media
HU-007	Pruebas de validación del módulo de informes	Media
HU-008	Administración y asignación de roles de usuario	Media
HU-009	Configuración general del sistema	Media
HU-010	Gestión de la estructura organizacional	Media
HU-011	Exportación de planes de acción a PDF y Excel	Baja
HU-012a	Visualización del tablero Kanban	Alta
HU-012b	Actualización de estado por arrastre en Kanban	Media
HU-013	Historial de auditoría y trazabilidad de cambios	Media
HU-014a	Informe consolidado de	Media

	cumplimiento	
HU-014b	Drill-down del informe gerencial	Baja
HU-015	Notificaciones por correo y alertas en el sistema	Baja
HU-016	Búsqueda avanzada y filtrado de evidencias	Alta
HU-017	Aprobación y retroalimentación de planes de acción	Media
HU-018	Recuperación y restablecimiento de contraseña	Alta
HU-019	Gestión de versiones y actualización de evidencias	Media
HU-020	Cierre y evaluación final de planes de acción	Alta

4. Organigrama

El organigrama representa la distribución de responsabilidades y funciones para el desarrollo del proyecto. Cada integrante tiene asignado un rol principal de acuerdo con las actividades que se deben realizar, incluyendo la gestión y seguimiento, la planeación ágil, los aspectos técnicos y la definición de requisitos y propuestas.

Nuestro equipo trabaja bajo la orientación del Product Owner/Cliente, Ing. Kerwin Barros, quien representa al cliente y valida que el desarrollo responda a las necesidades planteadas, de esta manera, el organigrama permite identificar fácilmente quién es responsable de cada área y cómo se organiza el equipo durante el desarrollo del proyecto.



Integrante	Rol para el organigrama
David Esteban Álvarez	Responsable de Gestión y Reportes
David Andrés Galindo	Responsable del Repositorio y Arquitectura (Líder Técnico)
Miguel Ángel Gómez	Responsable de Planeación Ágil (Scrum Master)
Juan Sebastián Martínez	Responsable de Requisitos y Propuestas

Product Owner / Cliente: Ing. Kerwin Barros.
